



नेपाल सरकार
खानेपानी मन्त्रालय

**मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान
समितिको बैठक**

तथा

प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा

आ.व. २०७६/७७

**रमाकान्त दुवाडी
सह-सचिव**

२०७६।०८।१२, बिहिवार



प्रस्तुतीको ढाँचा

- राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४, ४५ र ४६ औं बैठकले लिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति ।
- राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरू (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) को प्रथम चौमासिक लक्ष्य र प्रगतिका अतिरिक्त हालसम्मको समष्टिगत (Cumulative) प्रगति, समस्या र समाधानका उपायहरू ।
- मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको प्रथम चौमासिक लक्ष्य सहितको भौतिक प्रगति र पूँजिगत खर्च स्थिति स्पष्ट खुल्ने गरि वित्तीय प्रगति ।
- निकायगत प्रथम चौमासिक लक्ष्य सहितको भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ।
- ८०% भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको प्रगति कम हुनुका कारणहरू, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू ।
- प्रगति कम भएका आयोजनाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरू र उपयुक्त विकल्प सहित निर्णयका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावित विषयहरू ।
- विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरू ।
- रुग्ण ठेक्काको सम्झौता/ आयोजनाको अवस्था विवरण।



खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका सूचकहरुको उपलब्धि तथा लक्ष्यहरु



दिगो विकास
लक्ष्य सन् -२०३०

आधारसुचाहरु आ.व.०७५/७६

सुचक	हाल सम्मको उपलब्धि
आधारभूतस्तरको खानेपानी	८९%
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी	२१%
आधारभूतस्तरको सरसफाई सेवा	९९.७%
प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली	०%


लक्ष्य आ.व. ०७६/७७

सुचक	लक्ष्य
आधारभूतस्तरको खानेपानी	९२%
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी	२५%
आधारभूतस्तरको सरसफाई सेवा	१००%
प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली	३%

लक्ष्य पन्ध्रौं योजना (०७६/७७ -०८०/८१)

सुचक	लक्ष्य
आधारभूतस्तरको खानेपानी	९९%
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी	४०%
आधारभूतस्तरको सरसफाई सेवा	१००%
प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली	२०%

सुचक	दिगो विकास लक्ष्य
आधारभूतस्तरको खानेपानी	१००%
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी	९०%
आधारभूतस्तरको सरसफाई सेवा	१००%
प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली	५०%

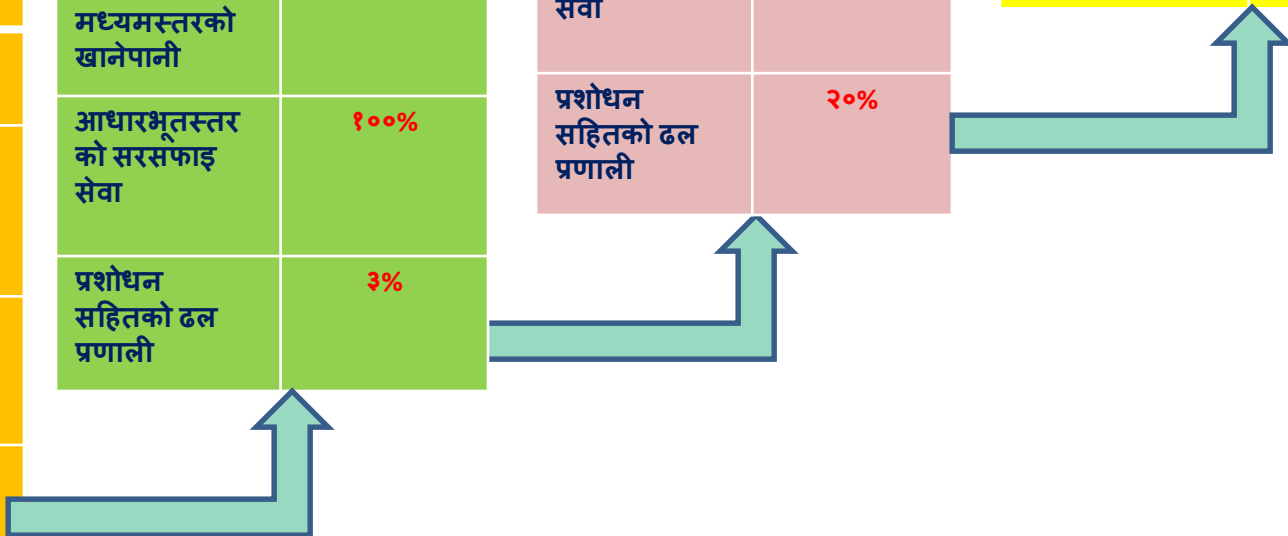



मन्त्रालयका आ.व.०७६/७७ का प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरु

सुचक	भार बार्षिक	०७५/७६ सम्मको	आ.ब. ०७६/७७ को लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगती
आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या	२५%	८९%	९२%	
उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या	२०%	२१%	२५%	
आधारभूतस्तरको सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या	१०%	९९.७%	१०० %	१००%
खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा	५%	६६	७७	७७




मन्त्रालयका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरु

सुचक	भार बार्षिक %	०७५/७६ सम्मको	आ.ब. ०७६/७७ सम्मको लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगती
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति	२०%	७०%	१००%	
मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च	१०%	५६%	१०० %	६.११%
बेरुजु फर्छ्यौट	५%	४३%	100 %	
गुनासो फर्छ्यौट	५%		१०० %	



नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको माइलस्टोन अनुसारको कार्तिक महिनासम्मको प्रगति

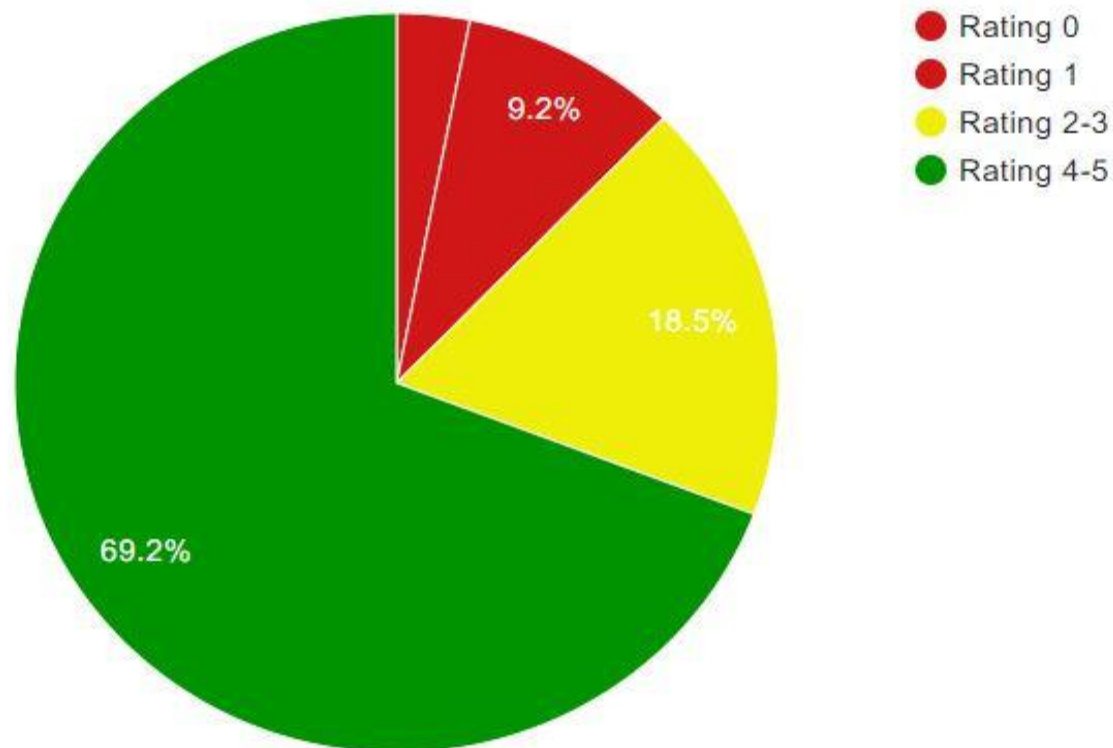



रास्ट्रिय गौरवका मेलम्ची खानेपानी आयोजना -१ (प्रथम चौमासिक प्रगति)



क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
हेडवर्क्स निर्माण (प्र.श.)	८	४	कोफर ड्याम निर्माणको लागि दायावबाँया किनारमा blasting सहित 500 m ³ Excavation गरिएको ।
सुरुङ्गको फाईनल फिनिसिङ्ग (कि.मि.)	४	३	सिन्धु, ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साईटमा रेक्टिफिकेसन(backfill grouting and installation of Rock bolt) समेत गरि फाईनल सपोर्टको काम गरिएको
पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भाग-२ (प्र.श.)	५	५	ईलेक्ट्रोमेकानिकल जडान गरिएको 500 m ³ RCC कार्य गरिएको



आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (मेलम्ची -२) प्रथम चौमासिक तथा हाल सम्मको प्रगति

सि.न.	क्रियाकलाप	लक्ष्य	प्रगति	हालसम्म
१.	थोक वितरण प्रणाली निर्माण (BDS)			
१.१	रिडरोडमा Ring Main पाइप विच्छ्याउने (कि.मि.)	१.१७	००	७४.३७
१.२	रिडरोड भित्री क्षेत्रमा Feeder Main र Transversal Main पाइपहरु विच्छ्याउने			
१.३	थोक वितरण प्रणाली Flushing and Testing गर्ने (कि.मि.)	४७	३१	६२
२.	वितरण संजाल निर्माण धारा जडान समेत (DNI)			
२.१	रिडरोड भित्री क्षेत्रमा वितरण पाइपहरु विच्छ्याउने (कि.मि.)	१३.९२	१३.३१	९०६.७५
पानी पोखरी निर्माण कार्य				
विभिन्न स्थानमा कूल ७४,५०० घ.मि. क्षमताका १० वटा पानीपोखरी निर्माण (प्र.श.)		.७	.१७	९१.१२



मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधानका प्रयास



समस्याहरु	समाधानका प्रयास
CMC का श्रमिक तथा कर्मचारीहरु र स्थानीय निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरुबाट निर्माण व्यवसायी CMC ले भुक्तानी नदिएको कारण आयोजनामा बर्षा अगावै गर्नु पर्ने अत्यावश्यक कार्यहरु सुचारु गर्दा पटक पटक अवरोध हुन गएको ।	CMC ले भुक्तानी गर्न बाँकि रहेको रकम सम्बन्धी माग दाबी भएको आधारमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको। प्राबिधिक समितिबाट आवश्यक कार्य भईरहेको ।
स्थानीय व्यक्ति फर्महरुबाट निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराईएको निर्माण सामग्री, Rent/Lease मा लगाईएको Equipment/ Machine हरुको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको ।	परामर्शदाता तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट Verification गरी व्यवस्थापन गरिएको ।



मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका प्रयास



समस्याहरू	समाधानका प्रयास
पानी प्रशोधन केन्द्रको मिनी हाइड्रो इकाइको परिक्षण संचालन नभएको । (Testing Commissioning आंशिक मात्र भएको ।) DLP थप गर्नु परेको ।	निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का संझौता कायम राख्न DLP को म्याद थप १ वर्ष बढाइएको ।
आयोजनाको दोश्रो चरणको लागि प्रवेशमार्ग निर्माणमा ढिलाई भएको	मआब्जा सम्बन्धमा निर्णय भएको । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई रकम उपलब्ध गराइएको ।
स्थानीयबाट मोटरबाटो, पुल, सिंचाई, खानेपानी मर्मत सुधारका लागि माग ।	माग भई आएका विभिन्न आयोजनाको सर्वेक्षण गरिएको । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको । थप बजेट व्यवस्थाको लागि अनुरोध



आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका मुख्य समस्या र समाधानका प्रयासहरू



मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
<p>१. विछ्याइ सकिएका पाइपहरूमा अन्य निकायहरूबाट क्षती पुर्याइ दिएको हुनाले क्षति भएका पाइपहरूको पुर्नस्थापनाको लागी पेश भए अनुसार नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।</p>	<p>1 क) सम्बन्धित क्षति पुर्याउनेहरूलाई यथावत गर्नको लागि पत्राचार गरिएको ।</p> <p>ख) संघिय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट समेत सम्बन्धित क्षती पुर्याउने मन्त्रालयहरू /निकायहरूलाई निर्देशन दिएको ।</p>
<p>२. मेलम्चीवाट पानी आईनसकेको कारणले गर्दा निर्माण ठेक्काहरूको प्रावधान अनुसार Testing तथा Commissioning नगरी Contract Close गर्न नसकिने । तर, नया नियमावली अनुसार ठेक्काको म्याद बढिमा १ बर्ष सम्म मात्र थप गर्न सकिने व्यवस्था वमोजिम सो अवधि भित्र Testing तथा Commissioning नसकिने भएको हुनाले ठेक्काहरू जिवितै Live राख्नु पर्ने विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकोले वर्तमान खरीद नियमावलीमा संसोधन वा विशेष निर्णय गर्नु पर्ने ।</p>	<p>ग) यस कार्यालयबाट क्षतीको विवरण सहित वजेट व्यावस्थाथापन र नितीगत सहमतीका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको ।</p> <p>२ म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा TPRM मा सहमती जनाएको । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरीनु पर्ने</p>



आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका मुख्य समस्या र समाधानका प्रयासहरू



मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
1) क) धोविघाट प्रशोधन केन्द्रमा स्थानीयहरूको अवरोधको कारण ढिलाई हुन गएको ख) सल्लाघारी प्रशोधन केन्द्रमा भ.न.पा. द्वारा जम्मा गरीएको Solid व्यवस्थापन गर्न बढि समय लाग्न गएको ।	स्थानिय निकायको सहयोगमा समस्या समाधान गरिएको ।
2) तेश्रो पक्षद्वारा बिच्याइएका इन्टरसेप्टर ढलमा क्षती पुर्याएको कारणले काम सम्पन्न गर्न ढिला भएको ।	
3) हनुमन्ते तथा मनहरा नदिको धार परिवर्तनको कारणले ढल विछ्याउने Alignment एकिन गर्न कठिन भईरहेको	स्थानिय निकायहरूसंग छलफल भईरहेको ।

आयोजना/कार्यक्रमगत प्रथम चौमासिक लक्ष्य र प्रगति

बजेट उ.शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक (रकम रु हजारमा)			
			भौतिक प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति%
१	२	३	६	७	८	९
313010113,४	खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्गत	२१५३८००	३५	२६२९४५	११६२३	4.42
313010123,4	जनसाधन विकास कार्यक्रम	५३५००	४५	१६०५०	६९९४	43.58
313010133,4	संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना	१५१५००	४०	४५४५०	३९९३८	87.87
313011013,4	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथ अनुगमन आयोजना	१८०००	४०	५४००	२९५	5.46
313011023,4	खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम	२३१७३००	35	६९५१९०	३२४१३	4.66
313011033,4	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	३५७३००	35	६०००५	८९१२	14.85

आयोजनागत प्रथम चौमासिक लक्ष्य र प्रगति

बजेट उ.शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक प्रथम चौमासिक (रकम रु.हजारमा)			
			भौतिक प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति%
१	२	३	६	७	८	९
313011043,4	तेश्रो साना सहरी खा.पा.तथा सरसफाई आयोजना	१५२८७००	४०	४५८६१०	१६०१७०	34.93
313011053,4	जलवायु अनुकूलित वृहत खा.पा. आयोजना	२९५१४००	४०	६६००३४	१७८६४८	27.07
313011063,4	ढल निर्माण तथा प्रसोधन कार्यक्रम	८५३०००	३५	२२६०३०	६१४६	2.72
313011073,4	खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम	१९७३५००	४०	५२०१४४	१४५७४५	28.02
313011083,4	सहरी खानेपानी तथा स.स.क्षेत्रगत आ.	३४१६९००	४०	१०२५०७०	२५२९५७	24.68
313011133,4	सहरी खानेपानी व्यवस्थापन सुधार आयोजना	१०२००	५	३०६०	०	0
	विभागको जम्मा	१५७८५१००	३८.१९	३९७७९८८	८४३८४१	२१.२१

आयोजनागत प्रथम चौमासिक लक्ष्य र प्रगति

बजेट उ.शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक (रकम रु हजारमा)			
			भौतिक प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति%
१	२	३	६	७	८	९
313000113	खानेपानी मन्त्रालय	११६३५५	६०	29973	१७३७४	57.97
३१३००१०१३	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	७३८९५००	37.28	1852577	२४०८३५	13.67
३१३५१०११३	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार कार्यक्रम	२१३९७००	३०.२३	713233	१४६८८०	20.59
३०११३१०५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	३२२७२१३	८५	९१५८५२	७५५५७८	८२.५०
३०११३१०५	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	२७१००००	६१	७१८३१९	३२५५२२	४५.०४
५०११३१०३	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	११०००००	९७.२२	३३००००	२८००००	८४.८५

निकायगत प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश

कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक (रु. हजारमा)			
		भौतिक प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति(%)
२	३	८	९	१०	११
खानेपानी मन्त्रालय	११६३५५	६०.००	२९९७३	१७३७४	५७.९७
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग	१५७८५१००	३८.१९	३९७७९८८	८४३८४१	२१.२१
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	७३८९५००	५२.७४	१८५२५७७	२४०८३५	१३.००
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	५९३७२१३	७३	१६३४१७१	१०८११३०	६३.९३
नेपाल खानेपानी संस्थान	२२५०००	१००	७५०००	०	०




निकायगत प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश



कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक (रकम रु हजारमा)			
		भौतिक प्रगति %	बजेट	खर्च	वित्तिय प्रगति(%)
२	३	८	९	१०	११
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	२१३९७००	३५.००	७१३२३३	१४६८८०	२०.५९
काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	१११०००००	९७.२२	३३००००	२८००००	८४.८५
जम्मा	४२६९२८६८	६८.०२	८६१२९४२	२६१००६०	३०.३०
प्रथम चौमासिक को भौतिक प्रगति %	६८.०२	प्रथम चौमासिक को वित्तिय प्रगति %		३०.३०	
बार्षिक बजेटको तुलनामा हाल सम्मको खर्च %	६.११				




प्रथम चौमासिक बजेट तथा खर्च (रु लाखमा)

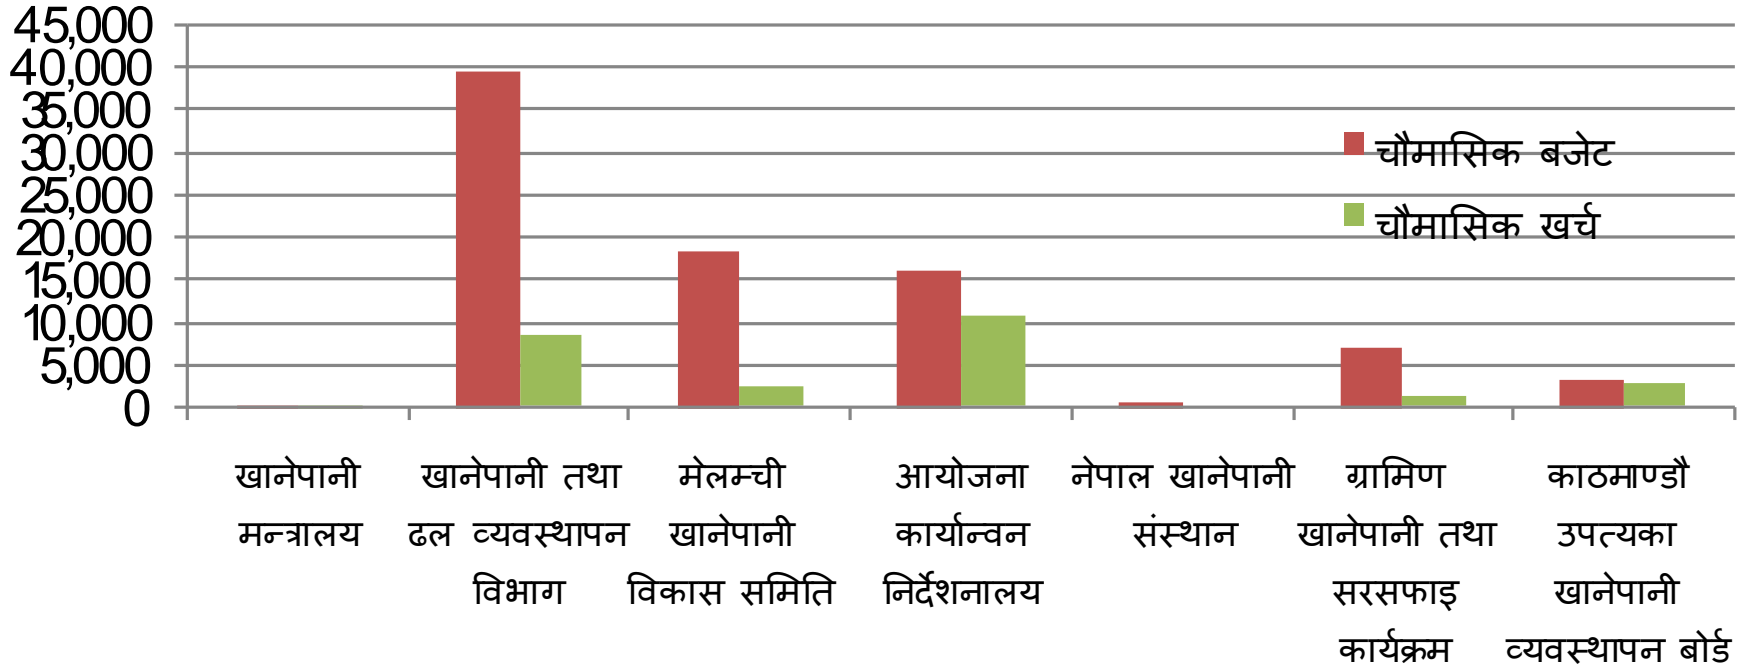



जम्मा बजेट र प्रथम चौमासिक खर्च (रु लाखमा)

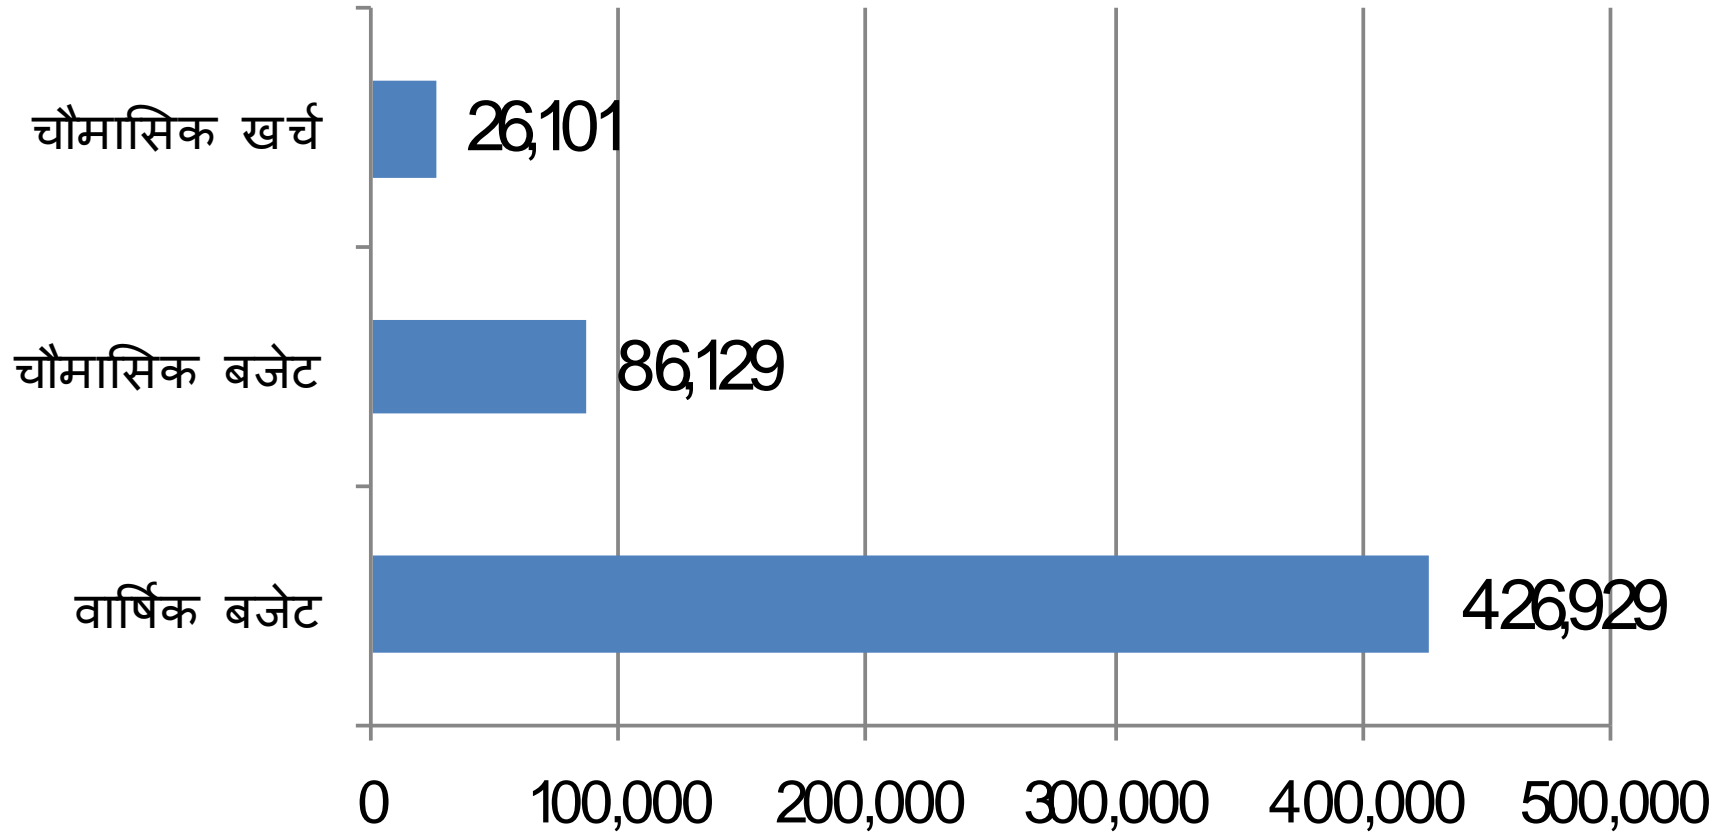



आ.व. ०७६/७७ का मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत

- खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई छलफलको क्रममा रहेको ।
- एक घर एक शौचालयको अवधारणा बमोजिम १००% जनसंख्या आधारभूतस्तरको सरसफाई सुबिधाबाट लाभान्वित भएको र २०७६ असोज १३ गते नेपाल लाई खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र एवं पूर्ण सरसफाइ तर्फ अग्रसर नेपाल घोषणा गरिएको ।
- यस आ.ब.को प्रथम चौमासिक सम्म ७ वटा आयोजना सम्पन्न भई ६८ हजार ६६२ जनसंख्या उच्च / मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको ।
- यस आ.ब.को प्रथम चौमासिक सम्म ३५ वटा आयोजना सम्पन्न भई १५ हजार ७४४ जनसंख्या आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको ।
- यस आ.ब.को प्रथम चौमासिक सम्म १३ वटा आयोजनाको सेवा पुनस्थापनभई ७ हजार ७३५ जनसंख्या आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको ।



खानेपानी बिभाग अन्तर्गत

➤ क्रमागत तथा नयाँ 60 वटा सहलगानीका आयोजनाहरूमध्ये २३ वटा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु हुने तथा १५ वटा आयोजना सम्पन्न हुनु पर्नेमा ४ वटा आयोजना सम्पन्न भई ३६ हजार १६२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको ।

➤ तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका २० वटा क्रमागत खानेपानी आयोजना मध्ये ३ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्नेमा २ वटा आयोजना सम्पन्न भई २७ हजार ५०० जनसंख्या उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा बाट लाभान्वित भएको ।

➤ जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत २ वटा आयोजना सम्पन्न हुनु पर्नेमा १ वटा आयोजना आंशिक रूपमा सम्पन्न भई ५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको ।



आ.व. ०७६/०७७ का मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष बिकास समिति अन्तर्गत

- ३५ वटा ग्राभीटी आयोजनाहरू सम्पन्न भई १५ हजार ७ सय ४४ जनसंख्या आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
- ७ जट्टा टुजिन चोफेहगफेसु ;DkGg k|ltj]bg k|fKt ePsf] छ ।
- १३ वटा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पूनः निर्माण गरी ७ हजार ७ सय ३५ जनसंख्या आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवाबाट पूनः लाभान्वित भएका छन् ।
- लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखा जिल्लामा यस आ.व. मा थप १६ वटा गरी जम्मा ३५२५ वटा खानेपानी स्किमहरूको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन भइ तथ्याङ्क अपलोड समेत भइसकेको ।
- लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखा जिल्लामा यस आ.व. मा थप ६३ वटा गरी जम्मा ९६५ वटा खानेपानी स्किमहरूमा Backstopping Support गरिएको ।
- लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखाका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका ६ वटा नगरपालिकाहरूको जम्मा ७५ वटा वडाका १४८ जनालाई VMW तालिम सम्पन्न गरिएको ।



आ.व. ०७६/०७७ का मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड तथा KUKL अन्तर्गत

- यस आ.व.मा ३५ स्थानमा वर्षातको पानी संकलन प्रविधि जडान गर्ने भनिएकोमा ११ स्थानमा प्रविधि जडान कार्य सम्पन्न भई थप ३३०० जनसंख्या खानेपानीको सेवाबाट लाभान्वित भएको।
- भूमिगत पानी व्यवस्थापन अन्तर्गत १५० वटा डिप ट्यूवेलको अनुमतीपत्र वितरण गर्नु पर्नेमा प्रथम चौमासिक सम्म २५ वटाको वितरण गरिएको।।
- यस आ.व.मा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ३० स्थानमा सतह स्रोतको संरक्षण गर्ने भनिएकोमा ३ स्थानमा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको।
- यस आ.व.मा ७ किमी ढल लाइन विस्तार गर्नु पर्नेमा हाल सम्म २.४ कि.मि. विस्तार सम्पन्न।
- काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र यस आ.व. ५० कि.मि. खानेपानी पाइप लाइन विस्तार गर्ने भनिएकोमा २५.७ कि. मि. विस्तार भएको।
- सुर्खवाक्षेत्रका जनताका लागि यस आ.व. मा ५००० ट्रिप ट्यांकरको पानी वितरण गर्नु पर्नेमा हाल सम्म १४०० ट्रिप ट्यांकरको पानी वितरण गरिएको।



आ.व. ०७६/०७७ का मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू

मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत

- आयोजनाको बाँकी कार्यहरू यथासिद्ध सम्पन्न गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।०२।०६ को बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम १० गोटा ठेक्का मध्ये मुख्य ५ गोटा ठेक्का सम्झौता(९३% ठेक्का लगाउने कार्य) सम्पन्न भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ र बाकि साना तिना ५ ठेक्काको तयारि कार्य गरिएको छ।



४४, ४५ र ४६ औ रा.वि.स.स.बाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रगति



निर्णय नं	कृयाकलाप	प्रगति
३.	४४ औ बैठकको निर्णय – बहुवर्षिय ठेक्का लागेका कार्यक्रम/आयोजनाहरुको हालसम्म सिर्जित दायित्वको एकमुष्ट यकिन तथ्याङ्क तयार गारि विषयगत मन्त्रालयहरुले २०७५ चैत्र मसान्त भित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।	तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र यस अघि आंशिक रुपमा तयार पारी पठाइएको ।



४५ औ रा.वि.स.स.बाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन प्रगति



निर्णय नं	कृयाकलाप	प्रगति
८.	<p>पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुमा विभिन्न निकायहरुबाट ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन हुदै आइरहेकोमा ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये कुल १८४८ वटा ठेक्का सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न नभई रुग्ण रहेकोले त्यसको समस्या समाधान गर्न समय बद्ध कार्ययोजना बनाई क्रमागत आयोजनाहरुको हकमा ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न गर्ने र न्यून कार्य सम्पादन भएका तथा पटकपटक म्याद थप गर्दा समेत कार्य प्रगति कम भएका आयोजनाहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिमको प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडी बढाउने ।</p>	<p>बिगतमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा ठेक्का सम्झौता अवधि भित्र सम्पन्न नभई रुग्ण रहेका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये १६ वटा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ बाँकि रहन आएका ४ वटा ठेक्काको अवस्था निम्न अनुसार रहेको छ ।</p>



मन्त्रालय अन्तर्गतका रूग्ण ठेक्काको अवस्था



क्र.सं.	आयोजनाको नाम	ठेक्का नम्बर	अंश/वर्ष (% / वर्ष)	हालको प्रगति (%)	आयोजनाको अध्यावधिक अवस्था	टिप्पणी
१	विदुर नगर आयोजना, नुवाकोट	TSTWSS SP/ICB- 03	२८ मे २०१९	९२%	निर्माण कार्य भैरहेको	
२	हर्नामाडी सहलगानी खा.पा. तथा स. आयोजना	01/072- 073, WSS DO, Mak awanpur	२०७६/० ३/१५	७०%	हालसम्म कुल कामको ६५% काम भएको, म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको	निर्माण व्यवसायी तर्फ नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकोले समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट ताकेता भैरहेको
३	तिमाल वृहत खा.पा.यो.	विभिन्न	२०७६/० ९/२४	५५%	हालसम्म कुल कामको ३६.६% काम भएको, म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको	Design estimateमा केही items हरु छुट्न गएकोले Variation order (VO) गर्नुपर्ने
४	यसोक खा.पा.यो.	01/072- 073/AZ/W SSDO, Panchthar	२०७५ /०३/२५	९५%	हालसम्म कुल कामको ९० % काम सम्पन्न भईसकेको	



४६ औं रा.वि.स.स.बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति



निर्णय नं	कृयाकलाप	प्रगति
४.	<p>लामो समयदेखि संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधुरा आयोजनाहरूको विवरण अधावधिक हुने नसकेको एवम प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका सडक, सिचाई तथा खानेपानीका क्रमागत वा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन लागि आवश्यक रकम नपुग हुने देखिएकोले संघीय मन्त्रालयहरूले तत्सम्बन्धी अधावधिक विवरण २०७६ साल कार्तिक महिना भित्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सबै प्रदेशहरूमा समेत पठाउने र संघका विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशले क्रमागत र अधुरा आयोजनाहरूको प्राथमिकिकरण गरि नपुग रकमको हकमा अर्थ मन्त्रालयसंग आवश्यक समन्वय गर्ने अर्थ मन्त्रालय श्रोत उपलब्धताको अबस्था हेरी यस प्रकृतिका आयोजन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने साथै ति आयोजनाहरूको अधावधिक विवरण प्रदेशले सोझै र स्थानीय तःहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् सोही अवधि भित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने </p>	<p>अधुरा आयोजनाहरूको विवरण तयार भैसकेका, सो सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने रकमको विवरण सबै निकायमा माग गरि पठाइएको </p>



समस्या तथा चुनौती



- खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा आयोजना संख्या, कार्य प्रकृति, भागौलिकता अनुसार कर्मचारी तथा कार्यालयको संख्या पर्याप्त नहुनु ।
- आयोजनाहरुमा बहुबर्षीय ठेक्का पट्टा गर्न चालु आ.ब. मा कुल लागतको एक तिहाई बजेट नभएकोले आयोजनाहरुको निर्माण सम्झौता गर्न समस्या रहेको ।
- मेलम्ची दोस्रो चरणमा मुआब्जा सम्बन्धि विवाद ।
- प्रदेशबाट संघमा आएको आयोजनाहरुको आवश्यक कागजातहरु हाल सम्म प्रदेश बाट हाल सम्म प्राप्त हुननसकेको ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीय सब कन्ट्याक्टर, भेन्डरहरुको CMC ध्वारा सिर्जित दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा स्पस्ट निर्णय हुनु पर्ने ।
- मेलम्ची आयोजना स्थलमा संभावित अवरोध न्यूनिकरण गर्नका लागि चुस्त दुरुस्त सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- मेलम्ची आयोजनाको पानी पथान्तरण पश्चात Benefit sharing (Levy) सम्बन्धमा समयमै आवश्यक निर्णय हुनु पर्ने ।
- काठमाण्डौ उपत्यकामा जडान भैसकेका खानेपानीका पाइप तेस्रो पक्ष द्वारा क्षति पुग्नु गएकोले सो को यथाशिघ्र पुनर्स्थापन गर्नु पर्ने ।



विविध



गुनासो

- हाल सम्म परेका गुनासो/उजुरीहरु : ३
- फर्छ्यौट भएका गुनासो/उजुरीहरु : ३
- प्रकृत्यामा रहेका गुनासो/उजुरीहरु : ०

बेरुजु

- बेरुजु रकम : ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख
- फर्छ्यौट : ९ करोड ४३ लाख

बेरुजु फर्छ्यौट : ०.८१ प्रतिशत



राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) ले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरु

- विभागको कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा संगठन पुनर्संरचना गर्ने ।
- गत आ.ब. 2075/76 मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका तर चालू आ.व. मा संघले कार्यान्वयन गर्ने गरी संघमै बजेट राखिएका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये कुनै प्रदेशले फिर्ता गर्न नचाहेको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन हुनुपर्ने ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी सि.एम.सि को ठेक्का तोडिएकोले निजले भूक्तानी दिन बाँकी रहेका आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक र श्रमिक हरुको भूक्तानी दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने ।
- मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याए पश्चात आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा काठमाडौंमा प्राप्त हुने पानीको महशूल मध्येबाट केहि लाभांश स्थानीयवासीलाई दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन हुनुपर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकामा पाइप लाईन विस्तार भइसकेको क्षेत्रमा तेस्रो पक्षद्वारा क्षति पुऱ्याइएकोले सो को क्षतिपुर्ति सम्बन्धित निकाय बाट उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्ने ।



धन्यवाद
